

Sanierungsmaßnahmen im Lausitzer Seenland

Rückblick auf 2024 und Ausblick auf 2025/26

Regionalkonferenz Lausitzer Seenland 16. April 2025

Zielstellung für die Fertigstellung der RLK einschließlich Großräschener See




Sanierungsfertigstellung der Wasserfläche auf + 100/101 m NHN
2026 nach verfügbarem Wasserdargebot:

- Großräschener See (RL Meuro) ca. 820 ha Wasserfläche
 - Sedlitzer See (RL Sedlitz) ca. 1.420 ha Wasserfläche
 - Partwitzer See (RL Skado) ca. 1.100 ha Wasserfläche
 - Geierswalder See (RL Koschen) ca. 650 ha Wasserfläche
- Σ ca. 4.000 ha Wasserfläche**

Sanierungsmaßnahmen – Großräschener See



Sanierungsmaßnahmen – Sedlitzer See

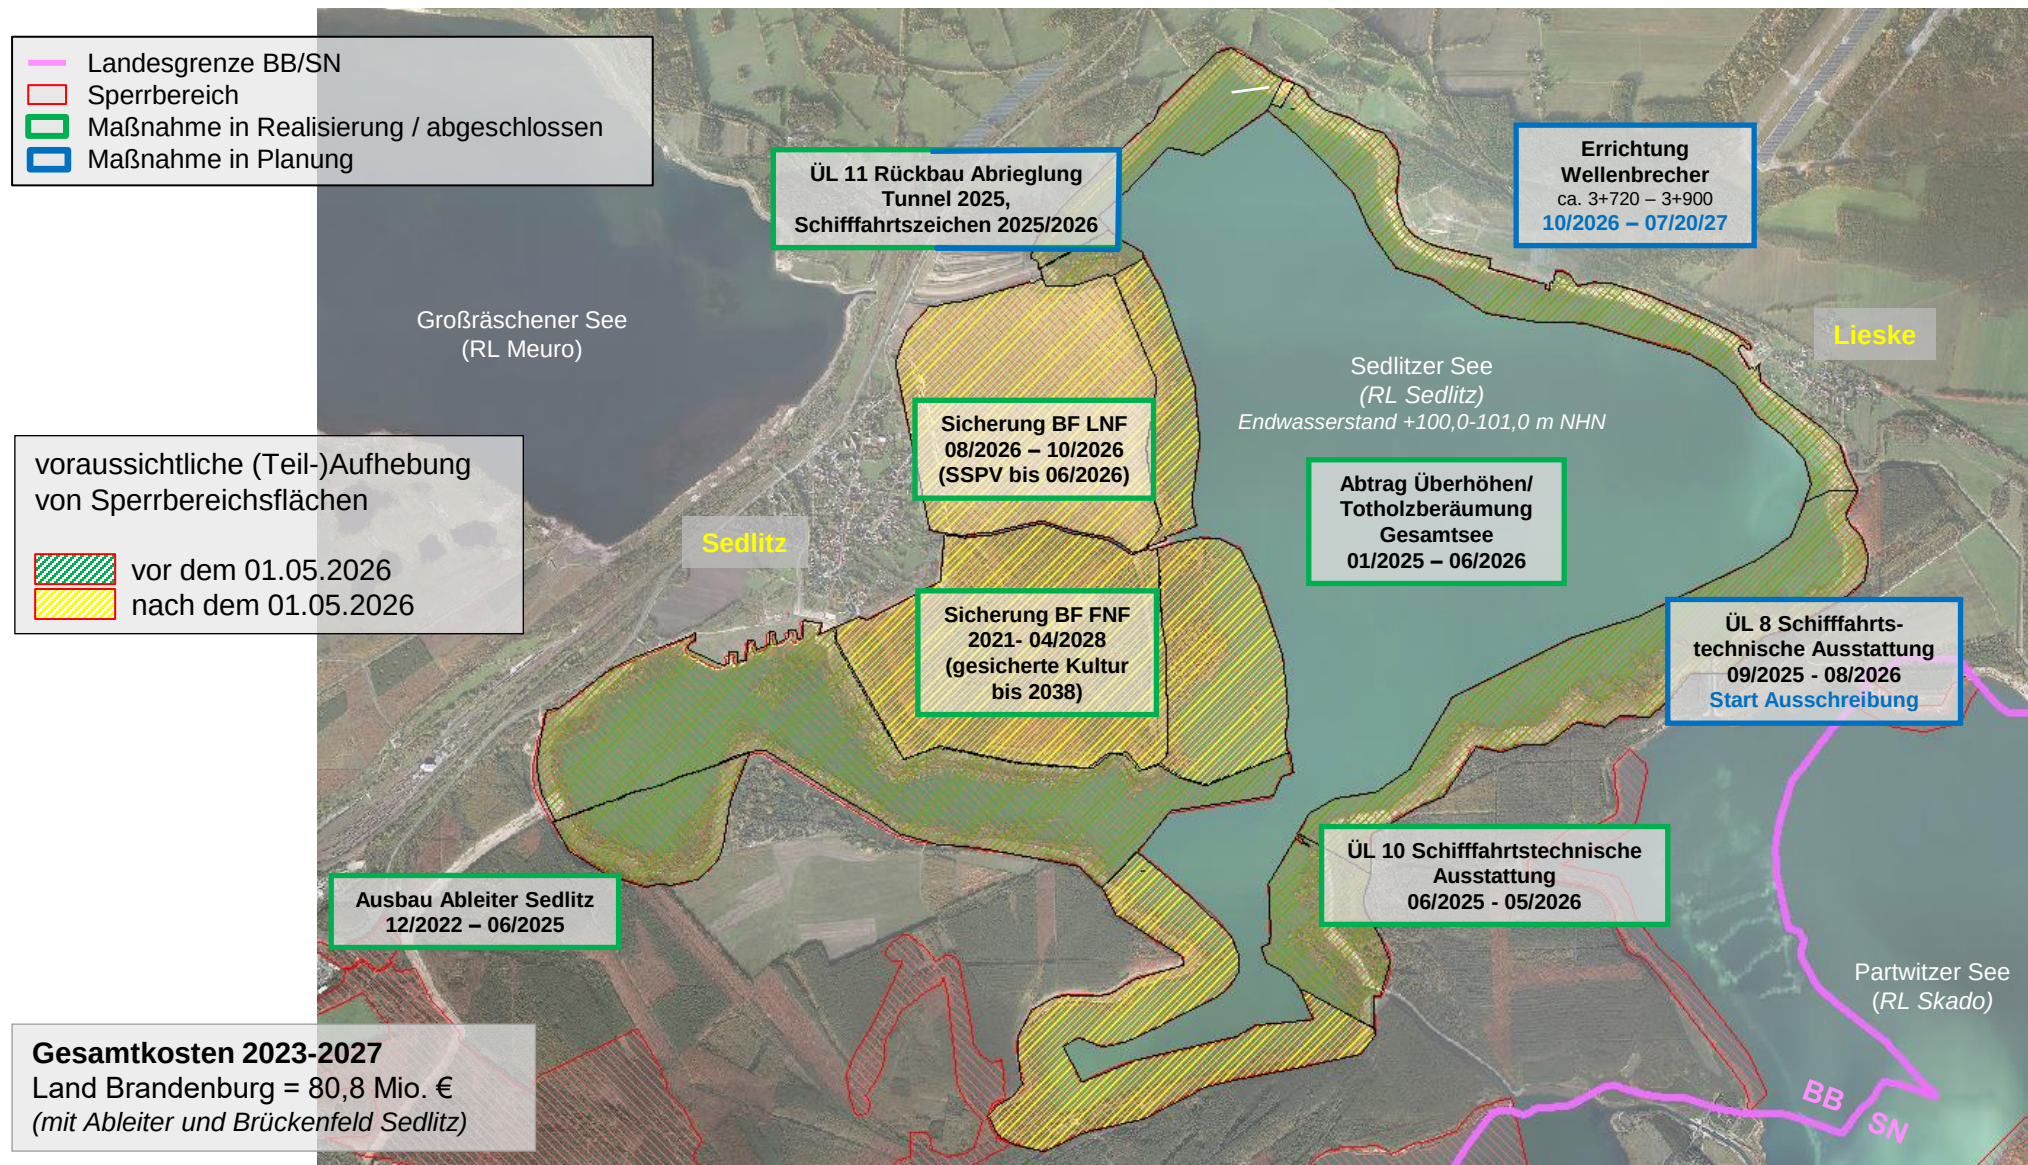

Sicherung Brückenfeld Sedlitz

Realisierung: 2021 – 2027

- 2023: Beginn vorbereitende Maßnahmen für die schonende Sprengverdichtung und Beweissicherung des Bestandes in der Ortslage Sedlitz
- Schonende Sprengverdichtung (SSPV): 16.01.2024 bis 11.2025
- ab 2026 Wiederherstellung des Geländes



Ableiter Sedlitz

Realisierung: 11/2022 – 06/2025

- 03/2023 – 09/2024: Ausbau Gerinne mit Grundwasserhebung
 - Länge: ca. 2.800 m
 - Sohlbreite: 7 m
 - Böschung: 1:2
 - Hydraulische Kapazität: 3 m³/s bei Mittelwasserverhältnissen



Stand 04/2025:

- aktuell werden die Faschinen und die Endprofilierung ausgeführt
- Trogbauwerk unter der B96 in Erstellung

Sedlitzer See – Totholzberäumung

Zeitraum 12/2024 – 06/2026

- ca. 200 ha Flächenberäumung im Gewässer 
(Totholzberäumung)
- Beseitigung Untiefen mit Schwimmbagger auf ca. 30 ha

RL Meuro
Großbräschner See

Sedlitz


RL Sedlitz
Sedlitzer See
100,43 m NHN

Senftenberg


RL Skado
Partwitzer See




Sanierungsmaßnahmen – Partwitzer See

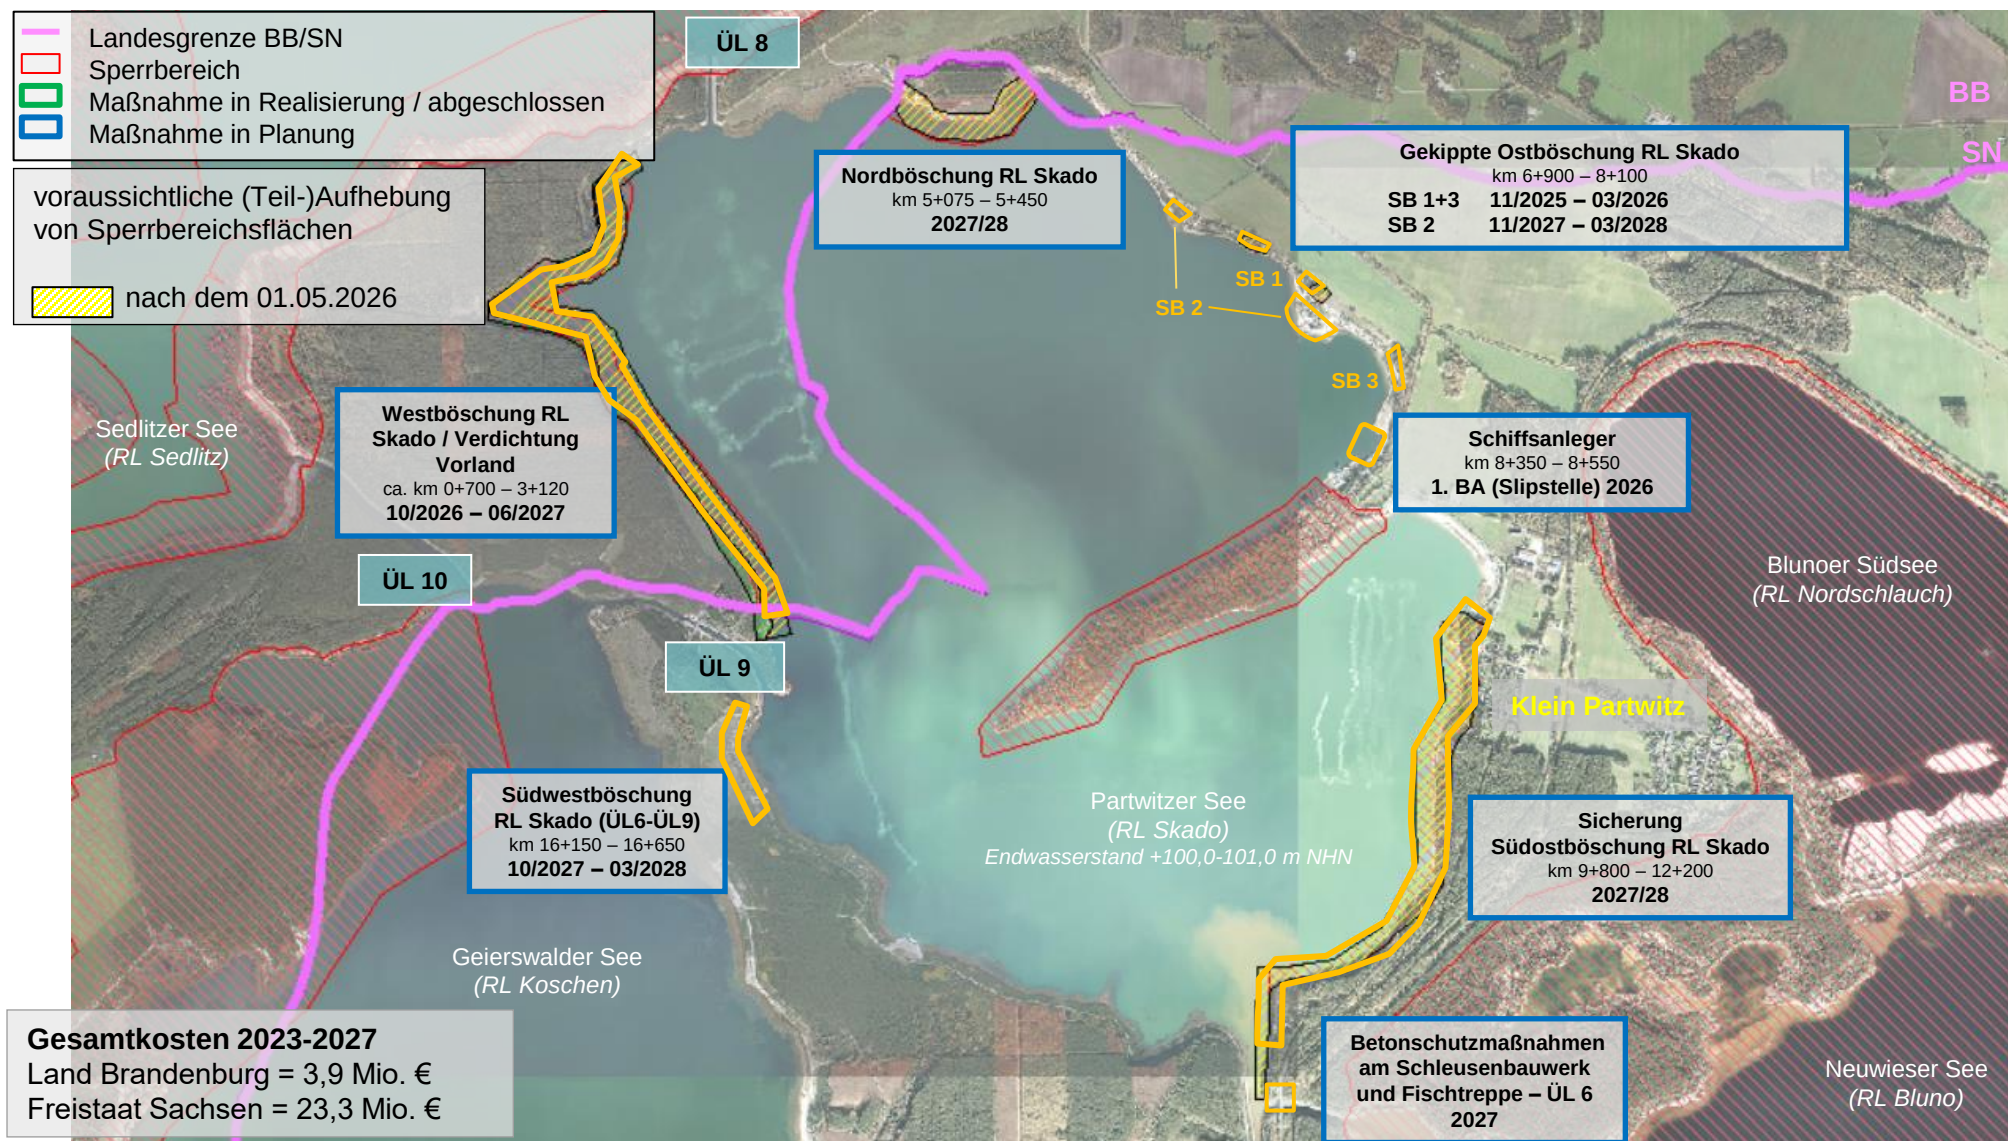


Sperrbereiche Partwitzer See

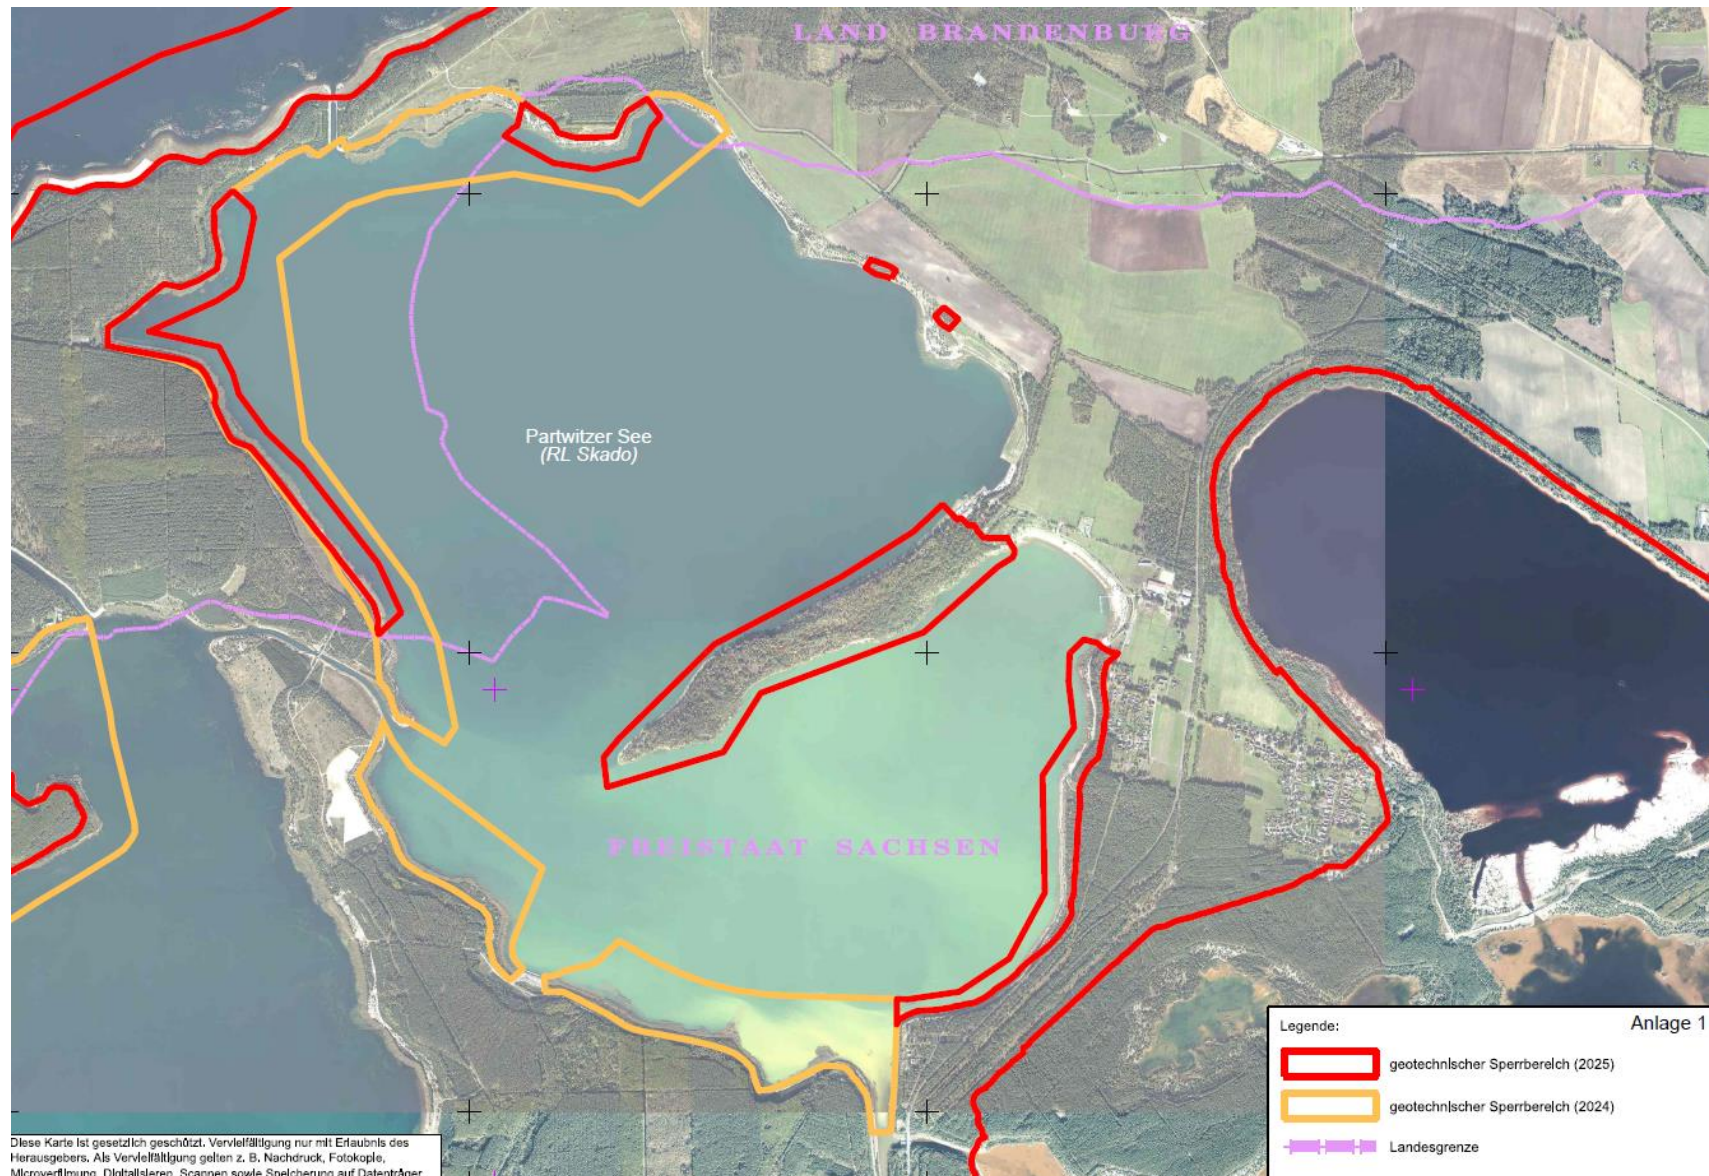


Sanierungsmaßnahmen – Geierswalder See

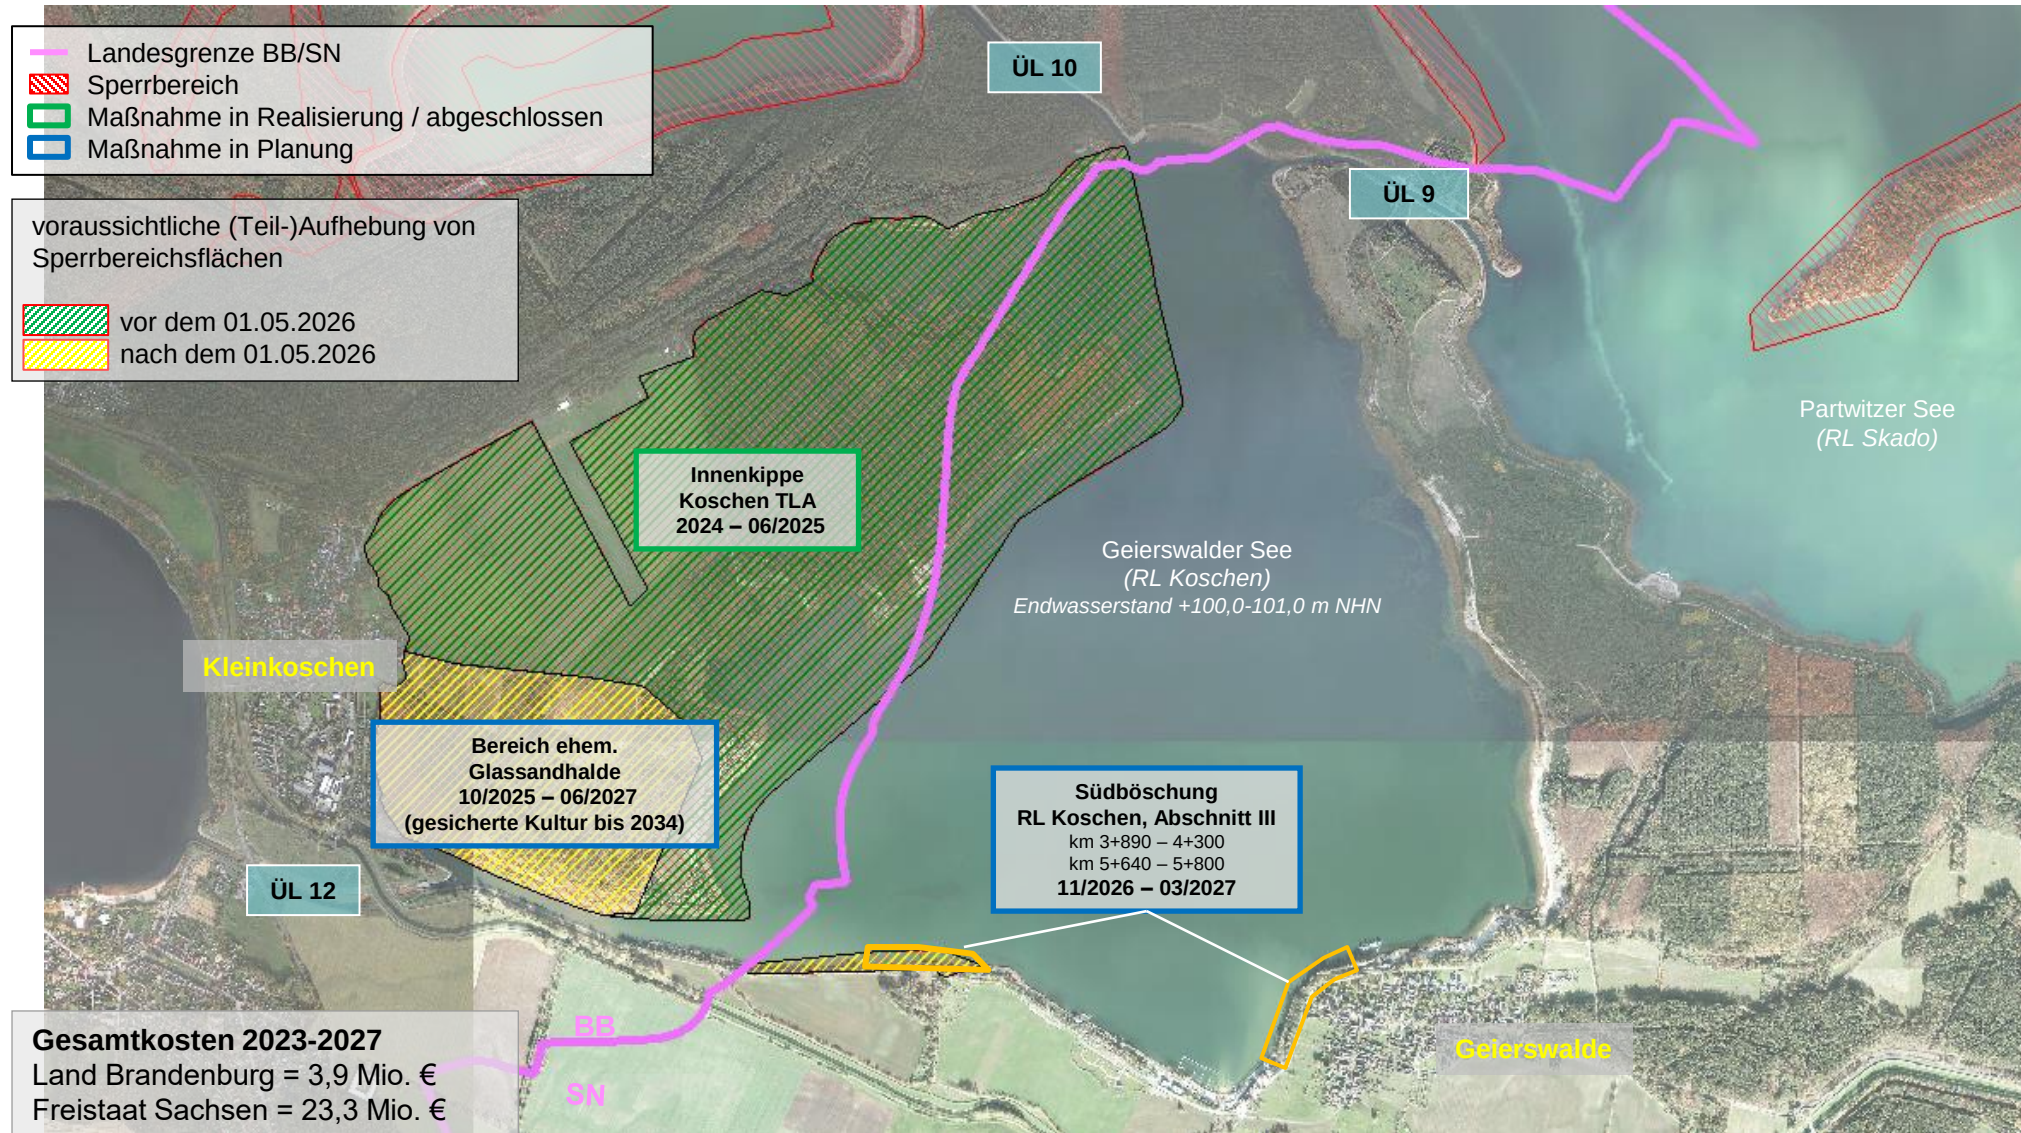

Sperrbereiche Geierswalder See

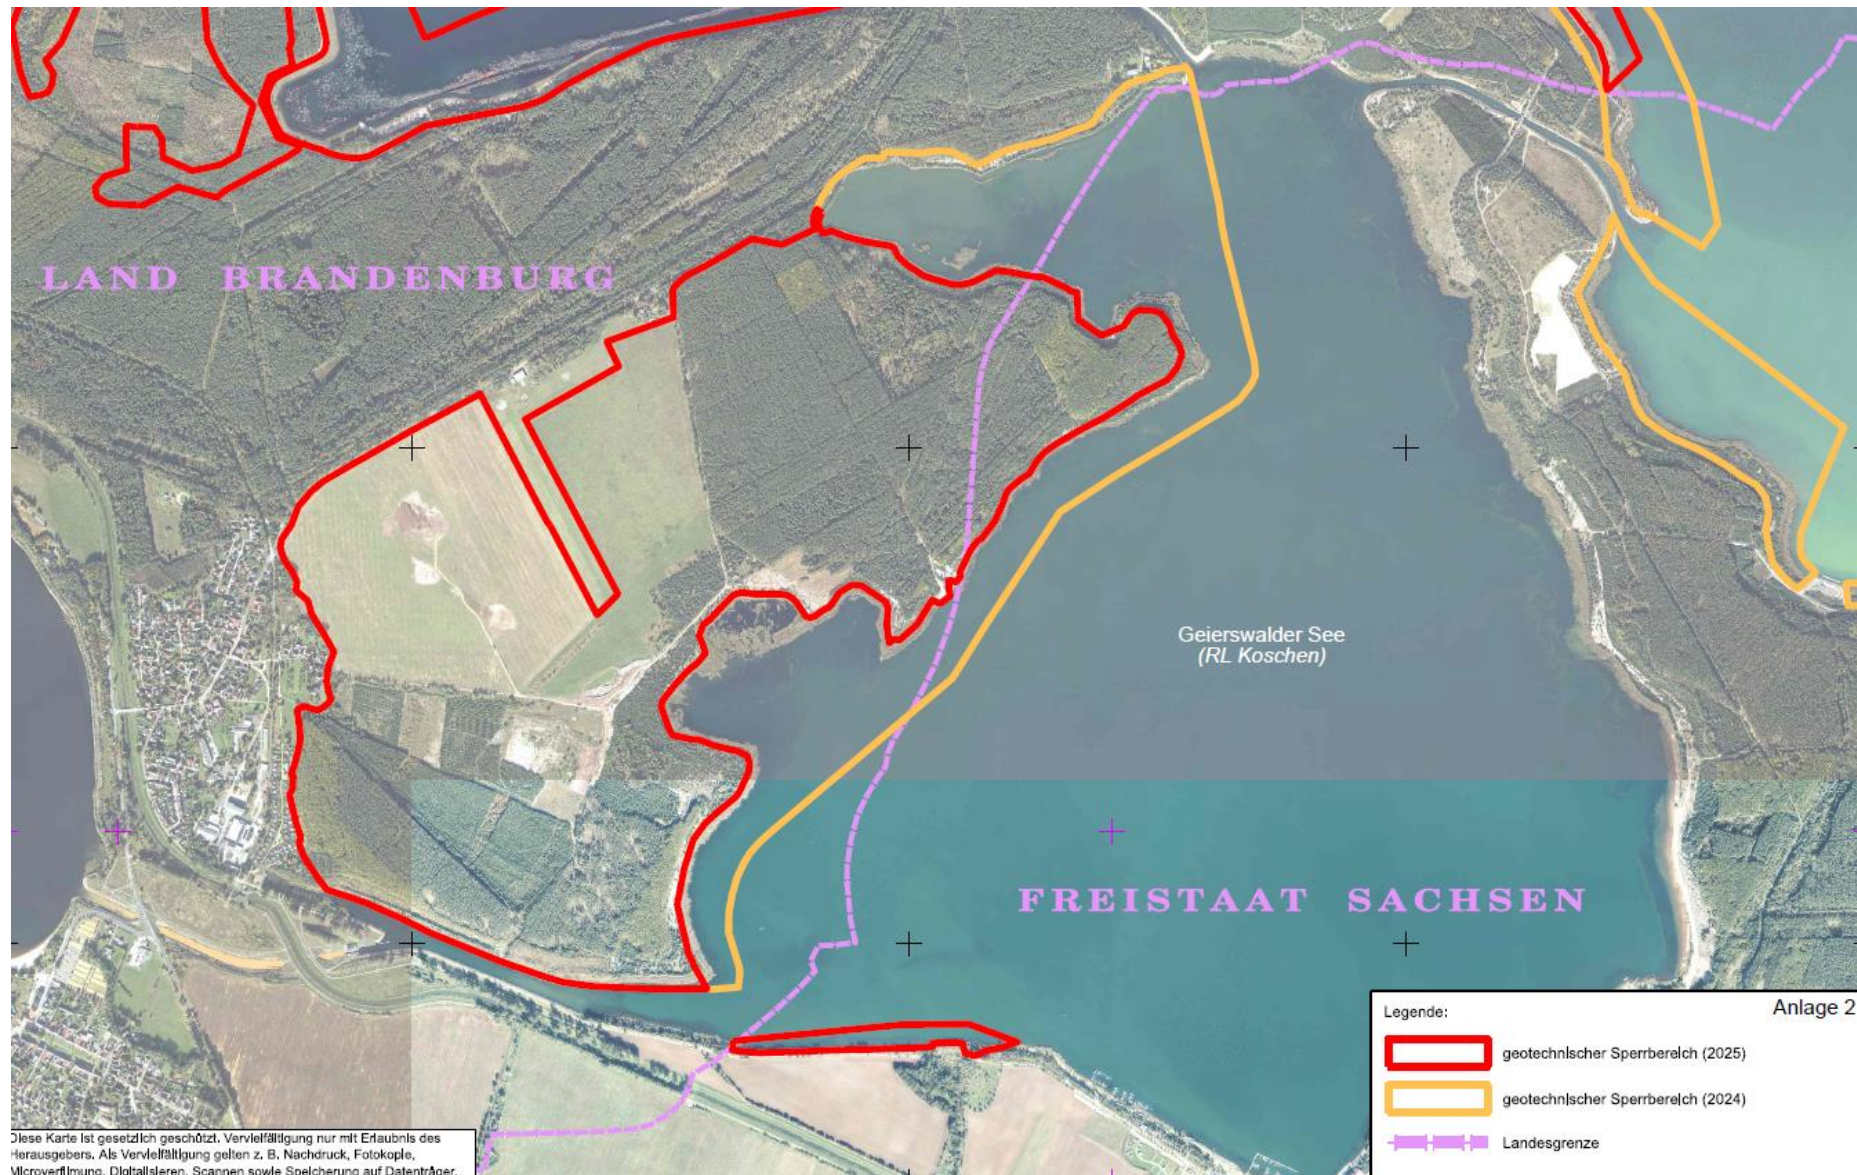

Vorbereitende Planungen Bundesstraße B97

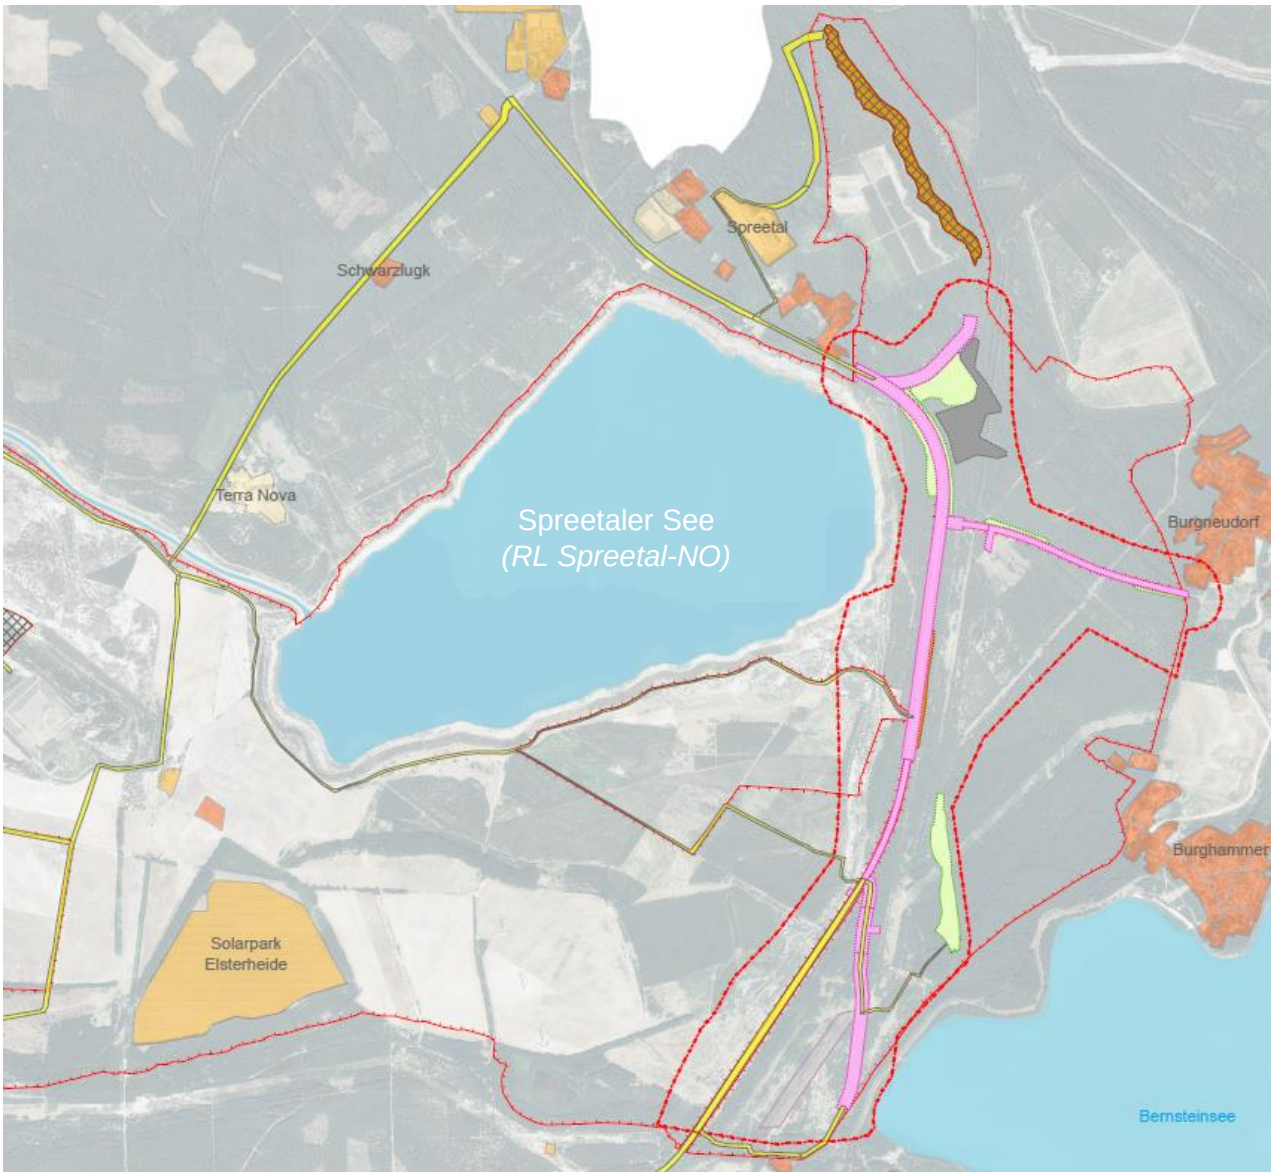

- Genehmigungsplanung zum Testfeld RDV
- Abstimmungen mit Flächeneigentümern
- Erarbeitung Umleitungskonzept durch das LASuV
- Gemeinsame Abstimmungen LASuV, LRA Bautzen, Gemeinden und LMBV zur Vorbereitung der notwendigen Umleitungsstrecken
- Planungen zu den Medienumverlegungen – MITNETZ STROM und VBH
- Erarbeitung Sonderbetriebsplan (SBP) Komplexmaßnahme B97/S130
- Erarbeitung von weiteren geotechnischen Vorgaben



Baubeginn nicht vor 2030
(Bauzeit ca. 5 – 10 Jahre)

§3 Uferbereiche Werminghoff I - Knappenrode



Leistungen 2024

- Vorschüttungsarbeiten im Bereich des Rutschungskessels abgeschlossen
- RDV-Arbeiten am Ostufer, nördlich des Rutschungskessels, wurde begonnen

Koblenzer Graben

- RDV-Arbeiten am Südost-Ufer des Knappensee abgeschlossen

Leistungen 2025

- Restleistungen (RDV/LRV) im Bereich S-Süd, bis ca. 10/2025
- Geplanter Beginn geotechnische Sicherung Rutschungskessel: 11/2025

§3 Verdichtungsarbeiten Silbersee Bereich P


RDV-Hauptteil

RDV-Testfeld
105 x 31,5 m

Erweiterter RDV-
Bereich

LRV-Bereich

Einsetzstelle

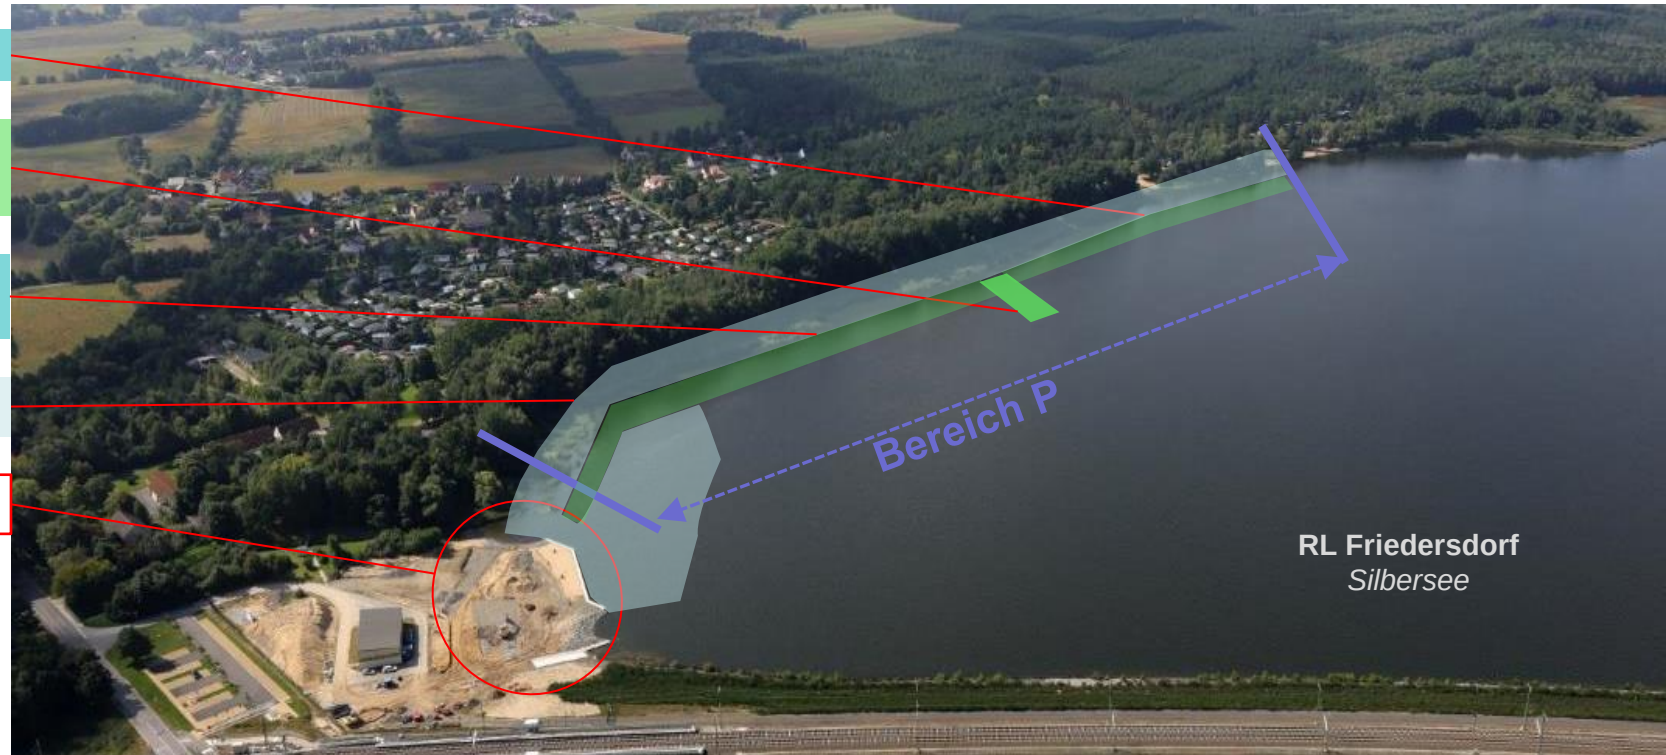

RL Friedersdorf
Silbersee

Arbeiten Silbersee Bereich P:

- I. Quartal 2024 - die Baufeldfreimachungs- und Holzungsarbeiten im Bereich P (südlicher Strandbereich) am Silbersee wurden abgeschlossen
- im Anschluss begannen die RDV-Arbeiten im Bereich P
- III. Quartal 2024 - die RDV-Arbeiten gemäß Ausführungsplanung fertiggestellt
- Aufgrund aktueller geotechnischer Erkenntnisse, wurde der Bereich der Rütteldruckverdichtung in Richtung Osten bis an das Zulaufbauwerk erweitert
- Erweiterung im III. Quartal fertig geplant und mit Durchführung begonnen





Glückauf!
